

2021

RELATÓRIO DE PROGRESSO

CG INEA 01/2010



RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

Item	PAP			Ação	Projeto	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações		
	Componente	Subcomponente	Programa			Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolsado	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Condição	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real	
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2 Ampliação da Base de Dados	1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	(26) Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Monitoramento - Fase 1: Aquisição de sonda multiparametro	R\$ 132.000,00	R\$ 125.903,66	R\$ 6.096,34	95,38%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	Concluído	Clean Environment	004/2021/AGEVAP	18/03/2021	14/09/2021	-	-		
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2 Ampliação da Base de Dados	1.2.2 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	(26) Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Monitoramento - Fase 2: Diagnostico completo para enquadramento	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 200.000,00	0,00%	Em andamento	0%	Em andamento								-	-	-	-	-	-	Aguardando encerramento da Fase 1.	
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2 Ampliação da Base de Dados	1.2.3 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	(26) Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Monitoramento - Fase 3: Monitoramento Contínuo	R\$ 438.000,00	R\$ -	R\$ 438.000,00	0,00%	Em andamento	0%	Em andamento								-	-	-	-	-	-	Aguardando encerramento da Fase 2.	
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	Despesas com ECOB	R\$ 4.026,62	R\$ 4.026,62	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	Despesas com ENCOB	R\$ 555,07	R\$ 555,07	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
6	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	Aquisição de materiais para o Comitê e eventos	R\$ 78.808,14	R\$ 78.808,14	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
7	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	Aquisição de camisetas para projeto da Vale Verdejante	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
8	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	I Concurso de Projetos de Boas Práticas Ambientais	R\$ 4.878,90	R\$ 4.878,90	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
9	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	II Concurso de Projetos de Boas Práticas Ambientais	R\$ 2.729,00	R\$ 2.729,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
10	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	Aquisição de Filmes Fotográficos para Projeto Pesquisa "Inventário de manifestações sensoriais da Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta Cincta, Rio de Janeiro"	R\$ 1.167,00	R\$ 1.167,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
11	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	Despesas com 8º Fórum Mundial da Água	R\$ 13.988,99	R\$ 13.988,99	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
12	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	Estagiário	R\$ 10.557,28	R\$ 10.557,28	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
13	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(04) Gestão Participativa e Comunicação	Atividades diversas	R\$ 2.489,00	R\$ 2.489,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
14	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(24) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Aquisição de camisetas	R\$ 30.750,00	R\$ 30.750,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
15	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(24) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Aquisição de troféus	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
16	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(24) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Aquisição de licenças do Google Meet	R\$ 11.250,00	R\$ -	R\$ 11.250,00	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	-	
17	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(24) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Atividades diversas	R\$ 3.036,01	R\$ 3.036,01	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
18	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(24) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Ações a serem definidas	R\$ 57.187,99	R\$ -	R\$ 57.187,99	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento								-	-	-	-	-	-	-	
19	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(23) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada e Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custos/ Ações de Diretoria	Ações a serem definidas	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento								-	-	-	-	-	-	-	
20	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(13) Programa de Educação Ambiental	Caravana das Águas	R\$ 152.608,23	R\$ -	R\$ 152.608,23	0,00%	Suspensão	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	Ato Convocatório suspenso. Aguardando fim da pandemia.
21	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(13) Programa de Educação Ambiental	Espaço Cillos do Paraíba Itatiaia	R\$ 314.869,34	R\$ -	R\$ 314.869,34	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	Ato Convocatório nº 13/2021 em andamento.
22	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(13) Programa de Educação Ambiental	Espaço Cillos do Paraíba Quatis	R\$ 314.869,34	R\$ -	R\$ 314.869,34	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	Ato Convocatório nº 13/2021 em andamento.
23	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(13) Programa de Educação Ambiental	Confecção de camisetas	R\$ 24.788,40	R\$ 24.788,40	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
24	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(13) Programa de Educação Ambiental	Aquisição de moulines	R\$ 1.506,70	R\$ 1.506,70	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	
25	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(13) Programa de Educação Ambiental	Aquisição de lavabos	R\$ 7.400,99	R\$ 7.400,99	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Está em trâmite a cessão de uso dos lavabos.
26	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(22) Programa de Educação Ambiental	Edital I - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental Projeto "Olhos Verdes"	R\$ 899,55	R\$ 899,55	R\$ -	100,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Francisco Idameo Gurgel Júnior	TC.002.002.001.20	12/03/2020	22/03/2020	-	-	Execução afetada pela pandemia. Vigência prorrogada.
27	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(22) Programa de Educação Ambiental	Edital II - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental Água pra toda vida: sensibilização sobre a importância do Rio Paraíba do Sul na conservação da biodiversidade da região Sul Fluminense	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Eliana Michelle Pavotti Fischer	-	-	-	-	-	-	Assinatura dos Termos de Concessão afetada pela pandemia.
28	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(22) Programa de Educação Ambiental	Edital II - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental Otimização da irrigação em horta orgânica com uso da plataforma Arduino	R\$ 3.487,02	R\$ -	R\$ 3.487,02	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		André Felipe Figueira Coelho	-	-	-	-	-	-	Assinatura dos Termos de Concessão afetada pela pandemia.
29	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(22) Programa de Educação Ambiental	Edital II - Projetos de Auxílio à Educação Ambiental Memória da Água	R\$ 4.995,25	R\$ -	R\$ 4.995,25	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Erika Cortines	-	-	-	-	-	-	Assinatura dos Termos de Concessão afetada pela pandemia.
30	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos																										


RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA Nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul


Data base: Junho/2021																											
Item	PAP			Ação	Projeto	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações		
	Componente	Subcomponente	Programa			Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação de Atas Convocatório	Atas Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/ Condutor	Nº Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real	
61	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Rio das Flores	R\$ 159.815,15	R\$ -	R\$ 159.815,15	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Seletria Consultoria e Projetos	008/2021/AGEVAP	27/04/2021	25/09/2022		-	
62	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Porto Real	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ 240.000,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Conducto Engenharia	-	-	-	-	Em fase de assinatura do contrato.	
63	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Quatis	R\$ 163.754,34	R\$ -	R\$ 163.754,34	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Sarsen Engenharia e Saneamento	-	-	-	-	Em fase de assinatura do contrato.	
64	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Rio Claro	R\$ 155.951,47	R\$ -	R\$ 155.951,47	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	
65	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto SES Pirai	R\$ 282.582,57	R\$ -	R\$ 282.582,57	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-	
66	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Águas do Médio	R\$ 157.683,04	R\$ -	R\$ 157.683,04	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento					-	-	-	-	-	Execução afetada pela pandemia.	
67	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Contrapartida PROTARAT I Barra Mansa	R\$ 376.745,85	R\$ -	R\$ 376.745,85	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		PM Barra Mansa	-	-	-	-	-	Em fase de viabilização do instrumento de transferência do recurso.
68	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projetos SES - Hierarquização Resolução CBH MPS nº 101/2021	R\$ 1.149.213,27	R\$ -	R\$ 1.149.213,27	0,00%	Em andamento	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	Possível aporte PROTARAT e/ou nova seleção de Projetos SES.	
69	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2 Drenagem Urbana e Controle de Cheias	2.2.2 Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	(15) Recuperação e Conservação de Faixas Marginais de Proteção	Espaço "Cilios do Paraíba" Porto Real	R\$ 325.300,00	R\$ 325.300,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	013/2018/AGEVAP	14/03/2018	09/10/2019	09/10/2019	-	
70	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	SIGA Web MPS	R\$ 120.000,00	R\$ 12.887,89	R\$ 107.112,11	10,74%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Codev/GT4W	001/2020/AGEVAP	26/03/2020	26/03/2023		-	
71	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Atlas RH III	R\$ 22.980,00	R\$ 22.980,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
72	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Impressão de material	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
73	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.1 Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	Ações a serem definidas	R\$ 54.305,73	R\$ -	R\$ 54.305,73	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	
74	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Projeto Piloto para Pagamento por Serviços Ambientais com Foco na Conservação e Restauração da Micro-Bacia do Rio Bananal	R\$ 191.999,99	R\$ 191.999,99	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Azevedo Consultoria	076/2015/AGEVAP	19/11/2015	08/07/2020	08/07/2020	-	
75	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Projeto Arquitetônico e Paisagístico - Espaço "Cilios do Paraíba"	R\$ 14.894,50	R\$ 14.894,50	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Ketzer Engenharia	035/2016/AGEVAP	14/09/2016	13/11/2016	13/11/2016	-	
76	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Espaço "Cilios do Paraíba" Porto Real	R\$ 44.248,61	R\$ 44.248,61	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	013/2018/AGEVAP	14/03/2018	09/10/2019	09/10/2019	-	
77	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Espaço "Cilios do Paraíba" Pinheiral	R\$ 802.559,17	R\$ 802.559,17	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	013/2018/AGEVAP	14/03/2018	09/10/2019	09/10/2019	-	
78	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Programa Mananciais CENAP	R\$ 66.759,00	R\$ -	R\$ 66.759,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	As atividades do Programa Mananciais já foram iniciadas. Aguardando a execução no MPS para realização do aporte de contrapartida.	
79	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Espaço "Cilios do Paraíba" Pinheiral	R\$ 66.989,43	R\$ 66.989,43	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Construtora e Transporte Pirai	013/2018/AGEVAP	14/03/2018	09/10/2019	09/10/2019	-	
80	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	(11) Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente e Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel	Programa Mananciais CENAP	R\$ 83.010,57	R\$ -	R\$ 83.010,57	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	As atividades do Programa Mananciais já foram iniciadas. Aguardando a execução no MPS para realização do aporte de contrapartida.	
81	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	(08) Ações Emergenciais	Apoio Financeiro para Manutenção do Abastecimento de Água no Município de Barra Mansa - Ação Emergencial	R\$ 38.200,00	R\$ 38.200,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	PM Barra Mansa	Convênio 02.024.003.2015	03/07/2015	13/07/2015	18/03/2016	-	
82	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	(08) Ações Emergenciais	Ações a serem definidas	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	
83	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	(14) Ações Emergenciais e Ações da Diretoria	Aquisição de lavabos	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Está em trâmite a cessão de uso dos lavabos.	
84	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	(14) Ações Emergenciais e Ações da Diretoria	Ações a serem definidas	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	
85	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Ações Emergenciais	(21) Ações Emergenciais e Programa de Mobilização Participativa	Ações a serem definidas	R\$ 17.900,00	R\$ -	R\$ 17.900,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento									-	-	-	-	-	-	
86	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(01) Ações da Diretoria	Atividades diversas	R\$ 463.656,21	R\$ 357.307,66	R\$ 106.348,55	77,06%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	
87	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(01) Ações da Diretoria	III Concurso de Boas Práticas Ambientais	R\$ 3.763,00	R\$ 3.763,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
88	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(14) Ações Emergenciais e Ações da Diretoria	Atividades diversas	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
89	Demandas CBH-MPS	Demandas CBH-MPS	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	(21) Diária/ Reembolso/ Ajuda de Custo/ Ações do Diretório																							

RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul

Data base: Junho/2021																									
Item	PAP			Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações
	Componente	Subcomponente	Programa			Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser Iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação de Ata Convocatória	Ata Convocatória	Emissão	Concluído	Empresa/ Condôcio	NT Contrato/ Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	
113	-	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Comitê Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Plano de Bacia - Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ 83.887,77	R\$ 71.923,08	R\$ 11.964,69	85,74%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Profil Engenharia e Ambiente	001/2018/AGEVAP	09/01/2018	17/07/2020		Contrato prorrogado para possibilitar uma maior integração na elaboração dos Planos da bacia federal e bacias estaduais. Planos de Bacia da RH-II aprovado pelo Comitê.
114	-	-	-	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Comitê Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	Ações a serem definidas	R\$ 47.246,73	R\$ -	R\$ 47.246,73	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento								-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Manutenção do site do FFCBH	R\$ 23.200,00	R\$ 19.280,00	R\$ 3.920,00	83,10%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-
116	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Despesas diversas para realização do ECOB	R\$ 66.152,31	R\$ 66.152,31	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
117	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento dos empregados da AGEVAP a serviço do FFCBH	R\$ 19.302,16	R\$ 19.302,16	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento dos membros dos Comitês a serviço do FFCBH	R\$ 49,46	R\$ 49,46	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
119	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Estagiário	R\$ 70.257,72	R\$ 56.257,72	R\$ 14.000,00	80,07%	Em andamento	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Reformulação do site	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento			-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Gerenciamento das mídias sociais	R\$ 19.120,00	R\$ -	R\$ 19.120,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento				-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH)	Ações a serem definidas	R\$ 63.372,60	R\$ -	R\$ 63.372,60	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento								-	-	-	-	-	-

- Observações**
1. Considerados os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e desembolsados pela AGEVAP até 30/06/2021.
2. Importante destacar que, como previsto na Cláusula Terceira, inciso III, alínea I) do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010, o Comitê Guandu e o Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) atuam como intervenientes deste contrato apenas para cumprimento do repasse de verbas previsto no artigo 11, inciso IV da Lei Estadual nº 4.247/03, que trata do percentual de repasse dos recursos da transposição das águas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu. Portanto, nesse relatório não são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transposição, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CEIVAP.
3. Itens 113 e 114 - Resolução CERH nº 147/2015: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitê Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Médio Paraíba do Sul.
4. Itens 115 a 122 - Resolução CERH nº 108/2013: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para ações da secretaria executiva do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia (FFCBH). Já que a coordenação do fórum e gestão dos recursos é do Comitê Médio Paraíba do Sul, os valores estão sendo apresentados neste relatório.

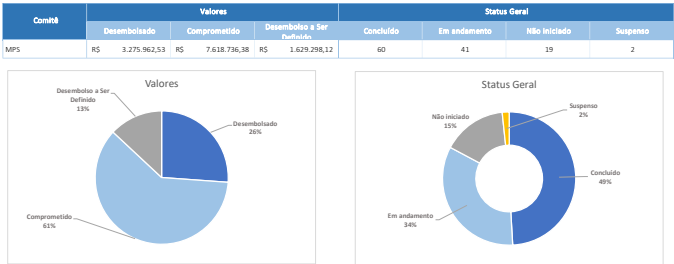




Date drawn: January/2023

Observation

Valores

Estado	Porcentagem
Desenvolvido a Ser Definido	28%
Desenvolvido	10%
Comprometido	62%



RELATORIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Rio Dois Rios

Data base: Junho/2021



Item	PAV			Ação	Projeto	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações
	Componente	Subcomponente	Programa			Total	Desembolsado	A desembolsar	%	Status	%	A ser iniciado	Elaboração da Edital e Convocatória	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Concedido	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2 Ampliação da Base de Dados	1.2.1 Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	(15) Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	Agente das Águas	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	Em fase de negociação com a Flocruz para assinatura de convênio.	
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(02) Gestão Participativa e Comunicação	Impressão de Materiais Gráficos	R\$ 6.292,00	R\$ 6.292,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(02) Gestão Participativa e Comunicação	Assessoria de Comunicação	R\$ 63.708,00	R\$ -	R\$ 63.708,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento							-	-	-	-	-	-	
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	(16) Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Assessoria de Comunicação	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento							-	-	-	-	-	-	
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	(13) Programa de Educação Ambiental	Agente das Águas	R\$ 535.000,00	R\$ -	R\$ 535.000,00	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	Em fase de negociação com a Flocruz para assinatura de convênio.	
6	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	(11) Programa de Mobilização Participativa	Projeto Diagnóstico e Intervenção	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	
7	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	(17) Cursos de Capacitação Técnica	Capacitação Técnica do CBH-R2R	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 45.000,00	0,00%	Suspensão	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	-	
8	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(03) Ações de Saneamento	Projeto SES Cordense II (Retiro, Centro, Dois Vales e Santo Antônio), (Constantino, Iperj/São Luís, Jardim de Alah e Lavínia), (Sumaré e Imeracard) e (Camaçari)	R\$ 241.909,96	R\$ 241.909,96	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Sanetech Serviços de Engenharia	006/2018/AGEVAP	22/01/2018	08/12/2018	17/06/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a finalização das atividades.	
9	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(03) Ações de Saneamento	Projeto SES Nova Friburgo (Barrado dos Mendes)	R\$ 30.607,68	R\$ 30.607,68	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Sanetech Serviços de Engenharia	002/2018/AGEVAP	10/01/2018	21/01/2019	21/01/2019	Contrato finalizado antes do fim do projeto por falta de retorno do município.	
10	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(03) Ações de Saneamento	Projeto SES Santa Maria Madalena (J largo do Machado e Arrachadouro) e (Centro e Parque Raporanga)	R\$ 240.207,31	R\$ 240.207,31	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Sanetech Serviços de Engenharia	003/2018/AGEVAP	10/01/2018	08/12/2018	21/04/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a finalização das atividades.	
11	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(03) Ações de Saneamento	Projeto SES Marcos (Centro)	R\$ 134.235,60	R\$ 134.235,60	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Sanetech Serviços de Engenharia	005/2018/AGEVAP	22/01/2018	08/12/2018	18/04/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a finalização das atividades.	
12	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(03) Ações de Saneamento	Projeto SES São Fidélis (São Vicente de Paula, Centro e Penha) e (Vila dos Coroados) (GT Fundinho)	R\$ 239.500,00	R\$ 184.415,00	R\$ 55.085,00	77,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Fahma Planejamento e Engenharia	048/2019	30/03/2019	02/04/2021		Contrato prorrogado para possibilitar a finalização das atividades.	
13	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(03) Ações de Saneamento	Projeto SES Bom Jardim (Banquete)	R\$ 100.930,09	R\$ 62.421,42	R\$ 38.508,67	61,85%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		Faveri Consultoria e Projetos	043/2019	02/03/2019	02/04/2021		Contrato prorrogado para possibilitar a finalização das atividades.	
14	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	(03) Ações de Saneamento	Projeto SES Duas Barras (Monnerat)	R\$ 314.125,14	R\$ -	R\$ 314.125,14	0,00%	Em andamento	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento		-	-	-	-	-	-	-	

Observações:

1. Considerados os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e desembolsados pela AGEVAP até 30/06/2021.

3. Itens 46 e 47 - Resolução CERH nº 147/2015: aprova a aplicação de recursos da compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hídricos para os Comitês afluentes da bacia do Paraíba do Sul: Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itapapoana. Valores apresentados representam somente o Comitê Rio Dois Rios.

Comitê	Valores			Status Geral			
	Desembolsado	Comprometido	Desembolsado a Ser Pautado	Concluído	Em andamento	Não Iniciado	Suspensão
RJR	R\$ 3.223.699,49	R\$ 6.076.870,02	R\$ 160.954,72	7	36	3	1



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES;JULIANA GONÇALVES FERNANDES;FERNANDA VALADÃO SCUDINO

A autenticidade deste documento 00034.000997/2021-43 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 7536C29F

Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Data Source: Jun/2021

[illegible]

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES;JULIANA GONÇALVES FERNANDES;FERNANDA VALADÃO SCUDINO


A autenticidade deste documento 00034.000998/2021-98 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: D7B4891F.



RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Baixo Paralisa do Sul e Indagante

Observação

1. Considerando os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e disponibilizados pela AGEVAP em 30/06/2021.
2. Importante destacar que, como previsto no Edital de Transferência, inciso IV, alínea b) do Contrato de Gestão Nº 01/2018, o Comitê Guardiã e o Comitê de Integração do Baixo do Rio Paralisa do Sul (CIGAP) devem, como compromissos desta contratação, apoiar o cumprimento do repasse de verbas previsto no Item 13, inciso VI do anexo I do Edital nº 4.247/2018, que trata do percentual de repasse dos recursos de transporte de passageiros da linha do Baixo do Rio Paralisa do Sul para o trecho do rio Guardião. Portanto, nesse relatório são apresentadas informações dos recursos financeiros provenientes da transferência, visto que a competência de deliberação e gestão desses recursos é do CIGAP.
3. Item 02 e 03 - Resolução CIGAP nº 147/2021, aprova a aplicação de recursos de compensação financeira para fins de geração de energia elétrica para elaboração do Plano de Recursos Hidroelétricos para os Comitês Guardiã do Baixo do Paralisa do Sul, Comitê Médio Paralisa do Sul, Paduaçu, Rio Dois Rios e Baixo Paralisa do Sul e Indagante. Valores apresentados representam somente o Comitê Baixo Paralisa do Sul e Indagante.



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES;JULIANA GONÇALVES FERNANDES;FERNANDA VALADÃO SCUDINO

A autenticidade deste documento 00034.000998/2021-98 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: D7B4891F.
