



20
20

RELATÓRIO DE PROGRESSO


CG INEA 03/2010



Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande		RELATÓRIO DE PROGRESSO Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020 Ações desenvolvidas pelo Comitê Baía da Ilha Grande																				Atualizado em 05/01/2021						
Item	Rio	PAU	Ação	Aplo	Projeto	Valores				Status Geral		Status Detalhado										Contorno				Observações		
						Total	Desembutido/	A desdobrar	%	Status	%	A ser iniciado	Elaboração do Edital de Convocação	Tratamento para Publicação do Edital	Acomodamento Edital	Elaboração de TA	Tratamento para Publicação do TA	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Emprego	MP Contrato	Data de Assinatura	Data de Término Previsto	Data de Término Real			
1	1. Proteção e Conservação do Meio Ambiente	1.1. Pagamento por serviços ambientais	[07] Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê Baía da Ilha Grande	Ações a definir		R\$ 1.063.138,99	R\$ -	R\$ 1.063.138,99	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1. Proteção e Conservação do Meio Ambiente	1.2. Estudo para Definição de Áreas Prioritárias	[16] Estudo para Definição de Áreas Prioritárias	Ações a definir		R\$ 115.339,77	R\$ -	R\$ 115.339,77	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1. Proteção e Conservação do Meio Ambiente	1.3. Atualização do Monitoramento de Áreas Prioritárias	[01] Atualização do Monitoramento de Áreas Prioritárias	Ações a definir		R\$ 327.115,69	R\$ -	R\$ 327.115,69	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diálogo/Apelo de Cuidado	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía da Ilha Grande	Ajuda de custo a membros		R\$ 25.554,30	R\$ 25.554,30	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diálogo/Apelo de Cuidado	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía da Ilha Grande	Deslocamento terreno e outros de membros		R\$ 18.090,52	R\$ 18.090,52	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diálogo/Apelo de Cuidado	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía da Ilha Grande	Interprete/Capacitação		R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diálogo/Apelo de Cuidado	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía da Ilha Grande	Despesas para a realização do ECOB		R\$ 373,59	R\$ 373,59	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.1. Ações de Diálogo/Apelo de Cuidado	[01] Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía da Ilha Grande	Despesas diversas		R\$ 387.623,21	R\$ 3.908,01	R\$ 383.715,20	1,01%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	Ação contínua.
9	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Materiais de divulgação do comitê		R\$ 2.131,00	R\$ 2.131,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Oficina de Planejamento Estratégico		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Aquisição de bombonas		R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Teatro ambiental		R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	0,00%	Suspensa	50%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Suspensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Suspensa em virtude da pandemia da COVID-19.
13	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Impressão de cartilhas de Saneamento Rural		R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.2. Ações de Educação Ambiental	[02] Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental	Ações a definir		R\$ 265.864,35	R\$ -	R\$ 265.864,35	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.3. Ações de Auxílio a Pesquisa	[08] Auxílio a Pesquisa	Edição de Auxílio a Pesquisa		R\$ 269.595,36	R\$ -	R\$ 269.595,36	0,00%	Em andamento	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4. Material de Divulgação	[00] Plano de Comunicação Baía da Ilha Grande BGS	Desenvolvimento, manutenção e atualização do site do CBH BGS		R\$ 20.330,00	R\$ 18.060,00	R\$ 1.260,00	93,80%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	St. Catena	02/12/2019	06/06/2019	06/06/2021	NA	-
17	2. Mobilização e Capacitação Ambiental	2.4. Material de Divulgação	[00] Plano de Comunicação Baía da Ilha Grande BGS	Ações a definir		R\$ 19.680,00	R\$ -	R\$ 19.680,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	3. Planejamento e Política	3.1. Levantamento e Registração de Imóveis	[06] Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região do Hidrografia da Baía da Ilha Grande - BGS	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Região do Hidrografia da Baía da Ilha Grande - BGS		R\$ 83.757,85	R\$ -	R\$ 83.757,85	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3. Planejamento e Política	3.1. Levantamento e Registração de Imóveis	[12] Levantamento e Registração de Imóveis	Ações a definir		R\$ 418.789,22	R\$ -	R\$ 418.789,22	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	3. Planejamento e Política	3.2. Elaboração do Manual Operativo do PHS BGS	[06] Sistema de Informações Geográficas - SIG - do Comitê Baía da Ilha Grande (Desenvolvimento do Software)	Previsão de serviços especializados para gerenciar, desenvolver, implantar, integrar, manter e atualizar o SIG - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento do Software)		R\$ 120.000,00	R\$ 9.398,31	R\$ 120.601,69	7,73%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	CONCÓRDO CODEVIG/RS	01/2/2020	26/03/2020	26/03/2021	-	-
21	3. Planejamento e Política	3.3. Estruturação do Banco de Projetos	[11] Estruturação do Banco de Projetos	Ações a definir		R\$ 25.773,64	R\$ -	R\$ 25.773,64	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	3. Planejamento e Política	3.4. Oficina de Planejamento	[09] Oficina de Planejamento	Ações a definir		R\$ 115.972,40	R\$ -	R\$ 115.972,40	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	4. Saneamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Plano Municipal de Saneamento Básico de Angra dos Reis		R\$ 257.817,63	R\$ -	R\$ 257.817,63	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	Myr. Projetos	05/12/2020/AGEVAP	28/12/2020	-	N/A	-
24	4. Saneamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraty		R\$ 270.000,00	R\$ -	R\$ 270.000,00	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	Consultoria Engenharia	04/12/2020/AGEVAP	26/12/2020	06/04/2022	N/A	-
25	4. Saneamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	[04] Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty	Ações a definir		R\$ 413.457,52	R\$ -	R\$ 413.457,52	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	4. Saneamento	4.1. Elaboração/ Revisão de Planos de Saneamento	[10] Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	Ações a definir		R\$ 332.936,24	R\$ -	R\$ 332.936,24	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	4. Saneamento	4.2. Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	[14] Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	Ações a definir		R\$ 530.223,63	R\$ -	R\$ 530.223,63	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	4. Saneamento	4.3. Projeto de Saneamento Rural	[13] Projeto de Saneamento Rural	Ações a definir		R\$ 300.258,24	R\$ -	R\$ 300.258,24	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	4. Saneamento	4.4. Auxílio a Pesquisa em Água e Saneamento	[17] Auxílio a Pesquisa em Água e Saneamento	Edição de Auxílio a Pesquisa		R\$ 83.233,94	R\$ -	R\$ 83.233,94	0,00%	Em andamento	11%	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações

1. Considerados os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e desembolsados pela AGEVAP até 31/12/2020.

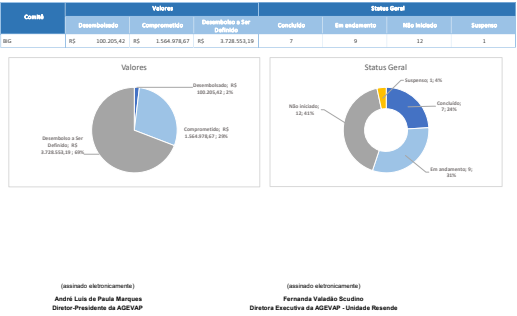

RELATÓRIO DE PROGRESSO Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020 Ações desenvolvidas pelo Comitê Guandu																										Atualizado em 20/01/2021	
Item	PAP			Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado								Contrato					Observações		
	Componente	Subcomponente	Programa			Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Concedor	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista		Data de Término Real	
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia	(01) Diretoria Colegiada CBH Guandu	Ajuda de custo para membros, telefones institucionais da diretoria, diárias de membros para participação em eventos, passagens aéreas, anuidade ABRH, etc.	R\$ 821.146,00	R\$ 569.062,49	R\$ 252.083,51	69,30%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	Ação contínua.	
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.3 Desenvolvimento Institucional de Gestão da Bacia	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada	Ações da Diretoria Colegiada	R\$ 7.749,82	R\$ -	R\$ 7.749,82	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento	(11) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos – CBH Guandu	Atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	039/2016/AGEVAP	06/10/2016	29/05/2018	04/04/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Recursos Hídricos	R\$ 430.438,73	R\$ 430.438,73	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Profil Engenharia e Ambiente	039/2016/AGEVAP	06/10/2016	29/05/2018	04/04/2019	Contrato prorrogado para possibilitar a execução das atividades.	
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Impressão do PERH Guandu e MOP	R\$ 27.405,00	R\$ 27.405,00	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
6	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.6 Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos a partir do Enquadramento	(20) Programa de Mobilização do Plano de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 583.837,54	R\$ -	R\$ 583.837,54	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Desenvolvimento de site, manutenção e hospedagem de domínio	R\$ 60.688,35	R\$ 60.688,35	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
8	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Impressão de materiais (boletins, revistas, folders, dentre outros)	R\$ 135.016,27	R\$ 135.016,27	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
9	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Despesas com eventos (ECOB, ENCOB, ExpoASEAC, Rio Water Week, dentre outros)	R\$ 96.117,86	R\$ 96.117,86	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
10	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Assessoria de Comunicação	R\$ 752.540,92	R\$ 752.540,92	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
11	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Estagiários de Comunicação	R\$ 124.001,44	R\$ 124.001,44	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
12	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Aquisição de bens permanentes, acervo fotográfico, e demais despesas	R\$ 23.249,40	R\$ 23.249,40	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	-	
13	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Plano de Comunicação	R\$ 830.000,00	R\$ 535.226,61	R\$ 294.773,39	64,49%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Approach	029/2019/AGEVAP	20/08/2019	20/08/2021	N/A	-
14	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.1 Desenvolvimento Institucional e dos Instrumentos de Gestão	1.1.7 Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	(02) Ações de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica	Ações a definir	R\$ 1.423.639,60	R\$ -	R\$ 1.423.639,60	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aguardando finalização do Plano de Comunicação para execução das ações.	
15	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Sistema de Monitoramento e Informações	1.3.1 Conceção e Implementação de Observatório da Bacia e Programa	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geomambientais	Prestação de serviços especializado para gerenciar, desenvolver, implantar, integrar, manter e atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento de Software)	R\$ 964.920,70	R\$ 74.740,33	R\$ 890.180,37	7,75%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	CODEX/GT4W	012/2020/AGEVAP	26/03/2020	26/03/2023	N/A	-
16	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Sistema de Monitoramento e Informações	1.3.2 Conceção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geomambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geomambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	R\$ 281.686,57	R\$ 281.686,57	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi ativado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
17	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Sistema de Monitoramento e Informações	1.3.2 Conceção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geomambientais	Estudos para implementação do Observatório da Bacia	R\$ 292.755,34	R\$ -	R\$ 292.755,34	0,00%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	ENVEX/FERMA	055/2020/AGEVAP	22/12/2020	15/08/2021	N/A	-
18	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Sistema de Monitoramento e Informações	1.3.2 Conceção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geomambientais	Ações a definir	R\$ 4.812.323,96	R\$ -	R\$ 4.812.323,96	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recursos serão aplicados na estruturação das ações definidas no Estudo para implementação do Observatório da Bacia. Necessário aguardar a finalização do estudo.	
19	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Sistema de Monitoramento e Informações	1.3.2 Conceção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	(14) Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 196.270,73	R\$ -	R\$ 196.270,73	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Sistema de Monitoramento e Informações	1.3.2 Conceção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	(14) Sistema de Informação de Recursos Hídricos	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geomambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu) - 1ª Contratação	R\$ 953.729,27	R\$ 953.729,27	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi ativado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
21	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Sistema de Monitoramento e Informações	1.3.2 Conceção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	(17) Ação Sistema de informações de Recursos Hídricos	Prestação de serviços para implementação do Sistema de Informações Geográficas e Geomambientais - RH Guandu (SIGA - Guandu)	R\$ 464.490,93	R\$ 464.490,93	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	K2FS Sistemas e Projetos	002/2015/AGEVAP	19/01/2015	19/01/2016	19/01/2020	O Contrato foi assinado com duração de 1 ano, porém, por se tratar de ação contínua, foi ativado considerando a necessidade de manutenção do sistema.	
22	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Sistema de Monitoramento e Informações	1.3.2 Conceção e Implantação de Sistema de Informação de Recursos Hídricos	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	Ações a definir	R\$ 602.845,95	R\$ -	R\$ 602.845,95	0,00%	Não iniciado																	

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES;FERNANDA VALADÃO SCUDINO

A autenticidade deste documento 00039.000227/2021-51 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: FBD5FCB1.

GUANDU

Comitê de Bacias Hidrográficas

RELATÓRIO DE PROGRESSO
Anexo I da Resolução INEA nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê Guandu

Atualizado em 20/01/2021

Item	PAP			Ação	Projetos	Valores				Status Geral		Status Detalhado										Contrato					Observações
	Componente	Subcomponente	Programa			Total	Desembolsado¹	A desembolsar	% desembolso	Status	%	A ser iniciado	Elaboração de Edital de Convocação	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório	Ato Convocatório	Execução	Concluído	Empresa/Concedido	Nº Contrato/Convênio	Data de Assinatura	Data de Término Prevista	Data de Término Real		
88	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	PAF Sacra Família - Município Vassouras	R\$ 337.500,00	R\$ 19.758,76	R\$ 317.741,24	5,85%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Município	3.004.001/2019	01/03/2019	01/03/2022	-	-	
89	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Aquisição de imagens de satélite para elaboração de Plano Diretor Florestal	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 600.000,00	0,00%	Em andamento	44%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Elaboração de Plano Diretor Florestal dos municípios da RH II	R\$ 3.623.641,50	R\$ -	R\$ 3.623.641,50	0,00%	Em andamento	67%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(03) Produtores de Águas e Florestas	Ações a definir	R\$ 7.174.343,85	R\$ -	R\$ 7.174.343,85	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(21) Projeto de Água e Floresta	PRO-PSA Guandu - PAF Sacra Família	R\$ 2.620.811,89	R\$ 882.998,20	R\$ 1.737.813,69	33,69%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	Crescente Fértil	028/2018	19/06/2018	19/06/2021	-	-	
93	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.3 Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos	(21) Projeto de Água e Floresta	Ações a definir	R\$ 122.146,74	R\$ -	R\$ 122.146,74	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.4 Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	(18) Diagnóstico de fontes e minas de água da região das Bacias Hidrográficas do Rio Guandu - Minas d'Água II¹	Diagnóstico de fontes e minas de água da região de abrangência das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, Guandu-Mirim e da Guarda e indicação de propostas de mitigação, com estimativa de custos, de ações de conservação, preservação ou melhoria de captação - Minas d'Água I	R\$ 844.573,73	R\$ -	R\$ 844.573,73	0,00%	Concluído	56%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	O edital não teve instituições habilitadas. Será necessário rever o formato.	
95	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.4 Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 26.178,31	R\$ 26.178,31	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Souza e Pereira Consultoria, Capacitação e Projetos	022/2012/AGEVAP	27/11/2012	27/11/2013	27/11/2013	Contrato cancelado.	
96	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.4 Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Realização de Diagnóstico de Fontes e Minas d'Água	R\$ 78.534,94	R\$ -	R\$ 78.534,94	0,00%	Reserva judicial	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.1. Proteção de Ecossistemas e Mananciais	3.1.4 Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	(07) Projeto Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água	Ações a definir	R\$ 39.014,75	R\$ -	R\$ 39.014,75	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.3. Proteção e Aproveitamento de Reservatórios	3.3.2 Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia	(09) Análise de Risco Plano de Contingência e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas d'Água II	Ações a definir	R\$ 75.851,46	R\$ -	R\$ 75.851,46	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.3. Proteção e Aproveitamento de Reservatórios	3.3.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e Bacias Contribuintes	(04) Prestação de Serviço de Monitoramento do Reservatório de Tocos	Monitoramento do Rio Piral à montante do Túnel de Tocos - Tocos I	R\$ 114.158,70	R\$ 114.158,70	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rhizobium Consultoria Ambiental	017/2011/AGEVAP	23/09/2011	23/03/2013	23/03/2013	-	
100	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.3. Proteção e Aproveitamento de Reservatórios	3.3.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e Bacias Contribuintes	(14) Plano de Manejo do reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes para dar continuidade ao Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocos	Monitoramento do Rio Piral à montante do Túnel de Tocos - Tocos II	R\$ 327.286,10	R\$ 327.286,10	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Rhizobium Consultoria Ambiental	054/2015/AGEVAP	10/11/2015	10/04/2017	10/04/2017	-	
101	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.3. Proteção e Aproveitamento de Reservatórios	3.3.1 Plano de Manejo do Reservatório de Lajes e Bacias Contribuintes	(14) Plano de Manejo do reservatório de Lajes e das Bacias Contribuintes para dar continuidade ao Projeto de Avaliação da Qualidade Ambiental do Reservatório de Tocos	Ações a definir	R\$ 1.806.038,25	R\$ -	R\$ 1.806.038,25	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	Demandas do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Aquisição de equipamentos, softwares e licenças	R\$ 200.189,09	R\$ 147.583,20	R\$ 52.605,89	73,72%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	
103	Demandas do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Aluguel, reforma e estruturação	R\$ 144.810,91	R\$ 74.805,47	R\$ 70.005,44	51,66%	Em andamento	78%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	
104	Demandas do Comitê Guandu	Demandas do Comitê Guandu	Sede do Comitê Guandu	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	Sede do Comitê Guandu	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ 1.600.000,00	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	-	-	-	(23) Participação no Evento Rio Water Week	Stand, materiais e participação do Comitê na Rio Water Week	R\$ 109.480,71	R\$ 109.480,71	R\$ -	100,00%	Concluído	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.	
106	-	-	-	(23) Participação no Evento Rio Water Week	Ações a definir	R\$ 40.519,29	R\$ -	R\$ 40.519,29	0,00%	Não iniciado	0%	Em andamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recurso repassado pelo INEA via Contrato de Gestão.	

Observações

1. Considerados os valores repassados à AGEVAP por solicitação do Comitê e desembolsados pela AGEVAP até 31/12/2020.

